



INFINITUS
RESIDENCE & CLUB

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENT O MENSAL

ABRIL/2025



COMENTÁRIOS

- ❖ Conclusão da base em brita graduada simples e aplicação de imprimação em toda camada de base.



COMENTÁRIOS

- ❖ Aplicação de C.B.U.Q na Rua do Cerrado.



COMENTÁRIOS

- ❖ Montagem da estrutura metálica (Pilares, vigas e cobertura) – Portária




COMENTÁRIOS

- ❖ Plantio de árvores na fachada externa – R. Derly Saldanha, fachada Leste.
- ❖ Aplicação de pavimentação asfáltica (CBUQ) – R. Derly Saldanha Gomes – Fachada Leste.



COMENTÁRIOS

- ❖ Montagem da estrutura metálica da Portária e Sauna & Spa.

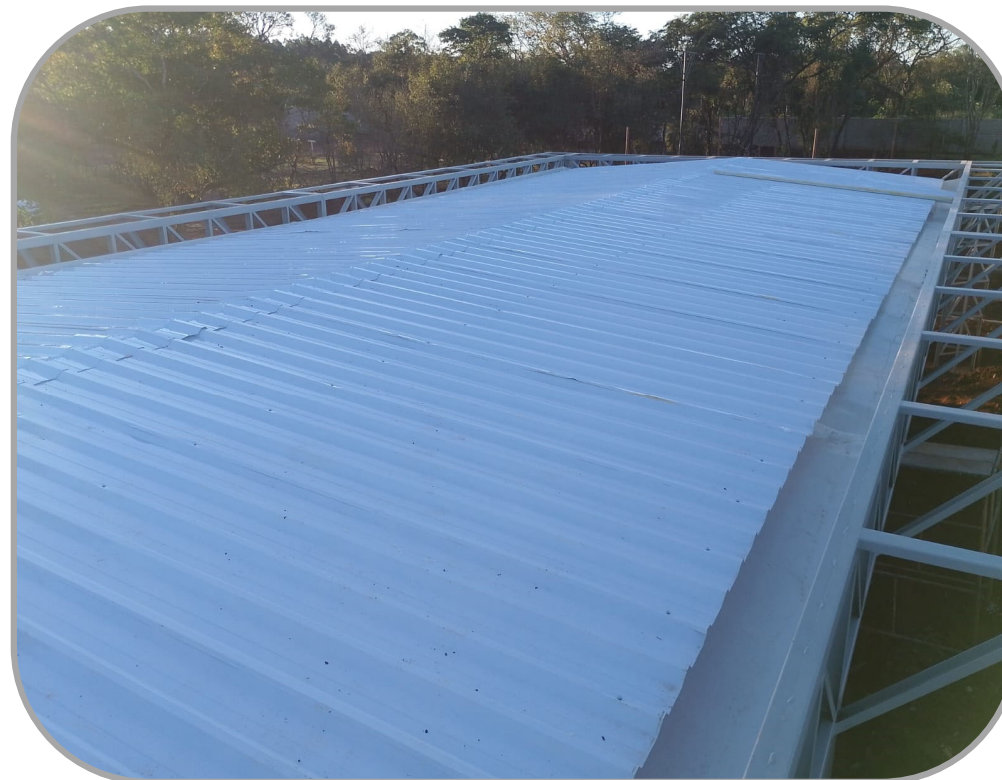

COMENTÁRIOS

- ❖ Montagem da Cobertura – Portária e Sauna & Spa.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução de Pavimentação asfáltica (CBUQ) – Rua floresta Amazônica.



COMENTÁRIOS

- ❖ Instalação final de postes da rede elétrica (Etapa 3).



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução de caixa elétrica padrão Copel para ligação de energia da rede pública ao condomínio.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução pavimentação asfáltica (CBUQ) – R. Floresta Amazônica.



COMENTÁRIOS

- ❖ Regularização da base para execução de calçamento em concreto referente a área de passeio.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução de calçada em concreto na área de passeio.



COMENTÁRIOS

- ❖ Armação de vigas baldrame e piso de concreto sobre solo.
- ❖ Aplicação de manta impermeabilizante tipo isostud.
- ❖ Passagem das instalações elétricas e hidráulicas.



COMENTÁRIOS

- ❖ Armação de vigas baldrame e piso de concreto sobre solo – Bar Molhado.
- ❖ Execução de formas das vigas baldrame – Bar Molhado.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução de reboco externo e requadro das caixas elétricas – Sauna & Spa.



COMENTÁRIOS

- ❖ Montagem da estrutura metálica (Pilares, vigas e cobertura).



COMENTÁRIOS

- ❖ Concretagem das vigas baldrame – Quadras Beach Tennis.
- ❖ Instalação de postes de iluminação e suporte para alambrado de nylon – Quadras Beach Tennis.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução da alvenaria de fechamento em blocos de concreto do muro – Quadra Poliesportiva.
- ❖ Preparação para instalação dos postes de iluminação e de suporte do alambrado – Quadra Poliesportiva.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução de sistema de aterramento – Portaria.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução das instalações elétricas – Sauna & Spa.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução de instalações elétricas (luminárias, tomadas e interruptores) e hidráulicas (água fria e esgoto) – Cozinha do Salão de Festas.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução de instalações elétricas (luminárias, tomadas e interruptores) e hidráulicas (água fria e esgoto) – Banheiros do Salão de festas.



COMENTÁRIOS

- ❖ Regularização da base para execução do piso de concreto sobre solo – Salão de Festas.
- ❖ Execução de instalações elétricas e esperas para passagem de eletroduto embutido no piso de concreto sobre solo – Salão de festas.



COMENTÁRIOS

- ❖ Execução da concretagem do piso de concreto sobre solo – Academia.
- ❖ Passagem de eletrodutos para tomadas de piso da academia.



INFINITUS
RESIDENCE & CLUB



CONSTRUTORA E INCORPORADORA
